


深水埗區公營房屋建屋進度報告 - 石硤尾邨重建 (截至2019年5月31日)


工程編號	工程說明	項目預算 費用 (百萬元)	發展種類	單位數目	擬住人口	工程計劃		備註
						動工日期	預算竣工日期	
KL48	石硤尾邨 第三、六及七期	1,608 (建築工程)	出租公屋	1060	3,240	2014年 第四季	2019年 第三季	第六期建築工程已於 2016年8月展開。
				480	1,470	2015年 第三季	2018年 第四季	第三期建築工程已於 2018年11月竣工。房屋 署獨立審查組已於 2019年1月31日發出入 伙紙，邨管已開始為住 戶辦理入伙手續。截至 2019年4月尾，入伙率 為93%。 第七期建築工程已於 2018年12月竣工，房屋 署獨立審查組已於 2019年3月11日發出入 伙紙，邨管已開始為住 戶辦理入伙手續。截至 2019年4月尾，入伙率 為96%。

美禧樓

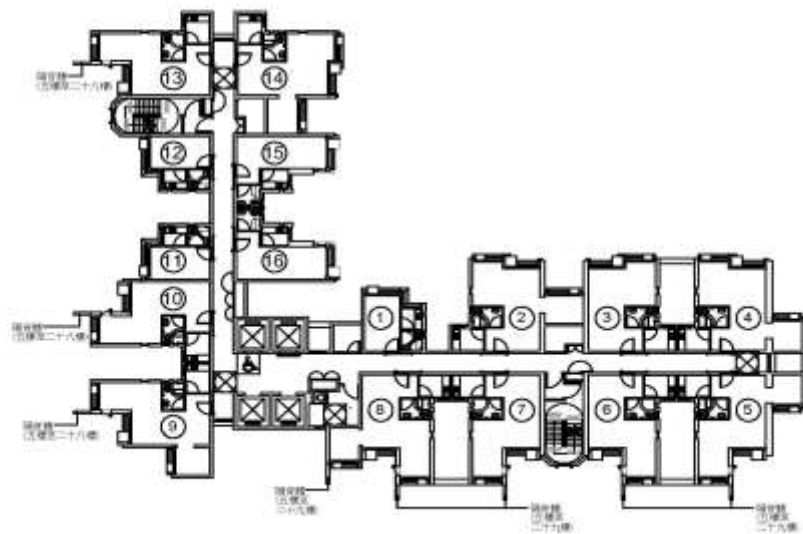

樓面平面圖

美柏樓

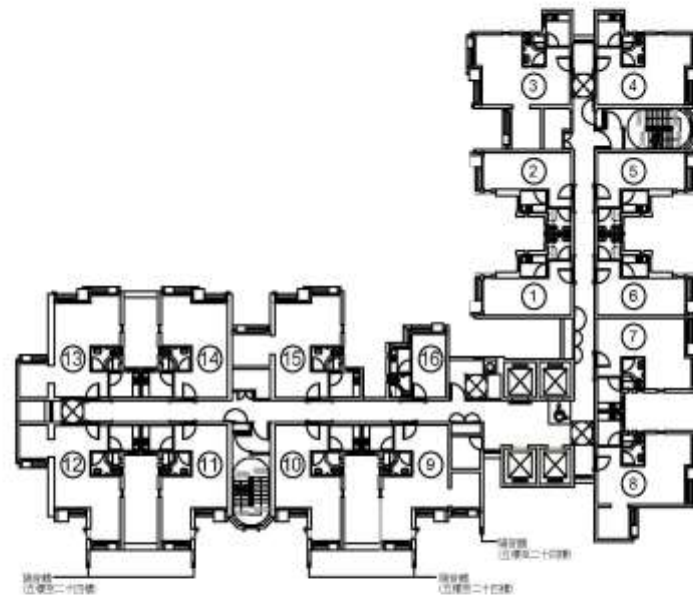

樓面平面圖
