



Redevelopment of Grantham Hospital (Phase 1)

葛量洪醫院重建計劃 (第一期)



Southern District Council Meeting

南區區議會會議

20 Jan 2022



Outline 報告大綱

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Project Overview | 計劃概況 |
| 2. Service Provision | 新增/擴展服務 |
| 3. Key Milestones of the Project | 重要里程碑 |
| 4. Report on Project Progress | 工程進度 |
| 5. Community Engagement | 社區聯繫 |



Services Provision upon Completion of GH Redevelopment (Phase 1) 重建計劃(第一期)完成後所提供的服務

現有服務 Existing Services

臨床醫療 Clinical Services

- 心臟內科 Cardiac Medical Unit
- 眼科 Ophthalmology Unit
- 老人科 Geriatric Medical Unit
- 紓緩醫學科 Palliative Medical Unit
- 風濕及臨床免疫科 Rheumatology & Clinical Immunology Unit
- 結核暨胸肺內科 Tuberculosis & Chest Medical Unit
- 專職醫療 Allied Health

擴充及新增服務 Service Expansion & New Services

- 癌症服務 Cancer services
- 老人服務 Geriatric services
- 放射科 Radiology services

香港大學 The University of Hong Kong

- 臨床創新及研發中心 Centre for Clinical Innovation and Discovery
- 癌症綜合關護研究所 Institute of Cancer Care




Redevelopment of Grantham Hospital (GH) - Phase 1

葛量洪醫院重建計劃 (第一期)

Key Milestones of the Project 重要里程碑

[Tentative Timeline]

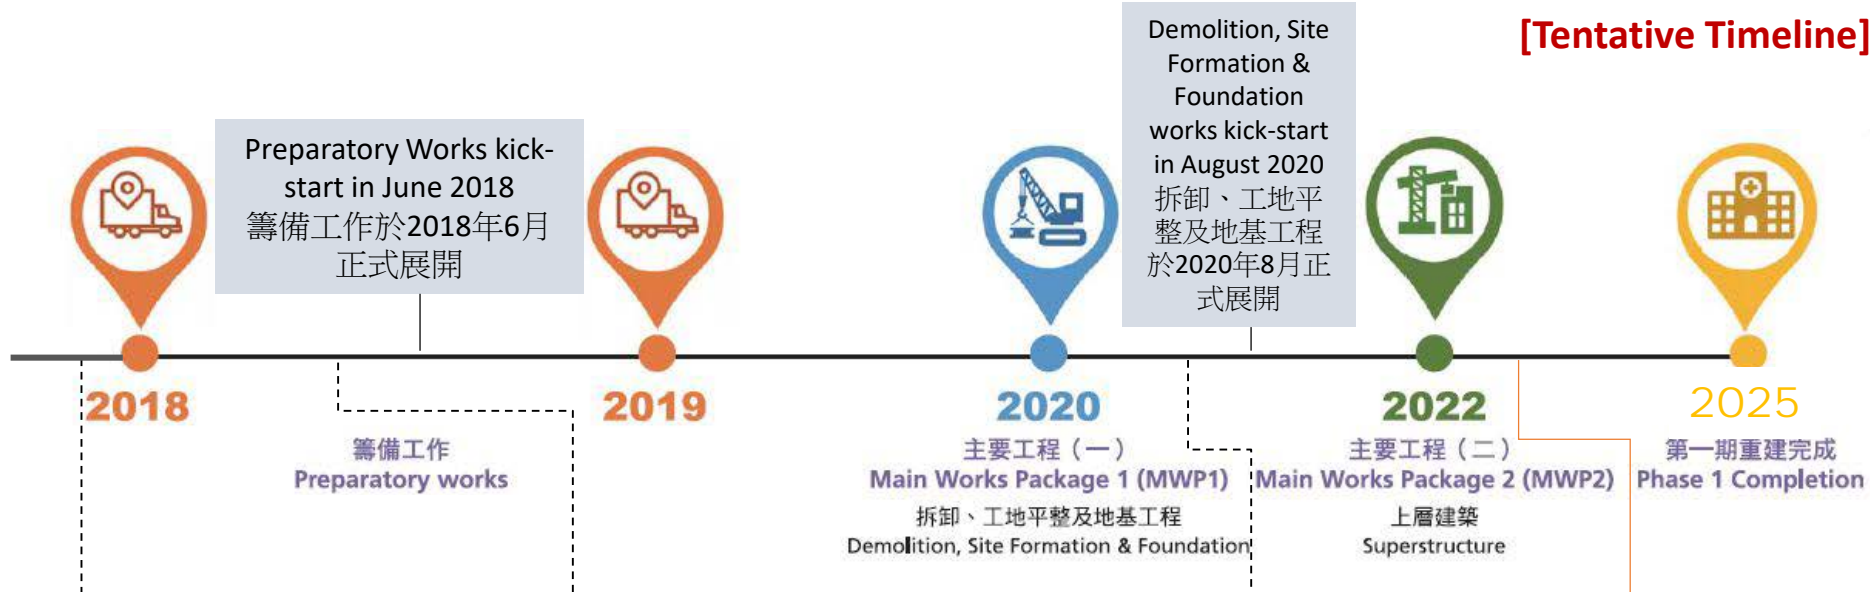

- 南區區議會已於2017年11月16日表示支持葛量洪醫院的重建計劃第一期
- Southern District Council supported the redevelopment of GH, phase 1 on 16 November 2017

- 籌備工作的撥款申請已於2018年5月18日獲立法會財務委員會批准撥款4億2,250萬元
- Finance Committee (FC) of Legislative Council (LegCo) approved estimated cost of \$422.5 million on 18 May 2018 for the Preparatory works

- 拆卸、工地平整及地基工程的撥款申請亦已於2020年6月26日獲得財務委員會批准撥款11億8,190萬元
- The funding application for the demolition, site formation and foundation works was approved by the FC on 26 June 2020 at an estimated cost of \$1,181.9 million

- 計劃於2022年第一季就擬議的主要工程(二)諮詢立法會衛生事務委員會，及於2022年第二季向工務小組委員會和財務委員會提交撥款申請
- Plans to submit the proposed Main Works Package 2 to the Health Services Panel of LegCo in 1Q 2022 and the funding applications to the Public Works Subcommittee and the FC in 2Q 2022



Redevelopment of Grantham Hospital (GH) - Phase 1

葛量洪醫院重建計劃 (第一期)

Project Progress (as at 7 January 2022)

工程進度 (截至2022年1月7日)



Works 工程	Progress 進度
Demolition of Senior Staff Quarters and Blocks 1 and 2 of Nurse Quarters 高級職員宿舍、護士宿舍第一座和第二座的拆卸工程	Completed 完成
Diversion of underground utilities works 遷移地下公用設施	Completed 完成
Tree felling and transplantation works 砍伐和移植樹木	Completed 完成
Site Formation works Excavation Works Site Foundation Works 工地平整工程 挖掘工程 地基工程	~ 51%



Redevelopment of Grantham Hospital (GH) - Phase 1

葛量洪醫院重建計劃 (第一期)

Progress Update 進度報告

1) Installation of Socketed H pile 安裝套接工字樁



2) Tree felling and transplanted works 砍伐和移植樹木



3) Excavation Works 挖掘工程



4) Demolition of Blocks 1 & 2 of Nurse Quarters and Senior Staff Quarters

護士宿舍第一座和第二座及高級職員宿舍拆卸工程





Redevelopment of Grantham Hospital (GH) - Phase 1

葛量洪醫院重建計劃 (第一期)

Community Engagement 社區聯繫

- 7th issue of Community Newsletter issued in December 2021
第七期葛量洪醫院重建快訊已於2021年12月推出





Redevelopment of Grantham Hospital (GH) - Phase 1

葛量洪醫院重建計劃 (第一期)

Thank you
謝謝
