




大埔公路（沙田段）道路擴闊及加建隔音屏障工程
雙程三線分隔行車道啟用後的交通情況及餘下工程進度

雙程三線分隔行車道啟用後的 交通狀況

雙程三線分隔行車道啟用後的交通狀況

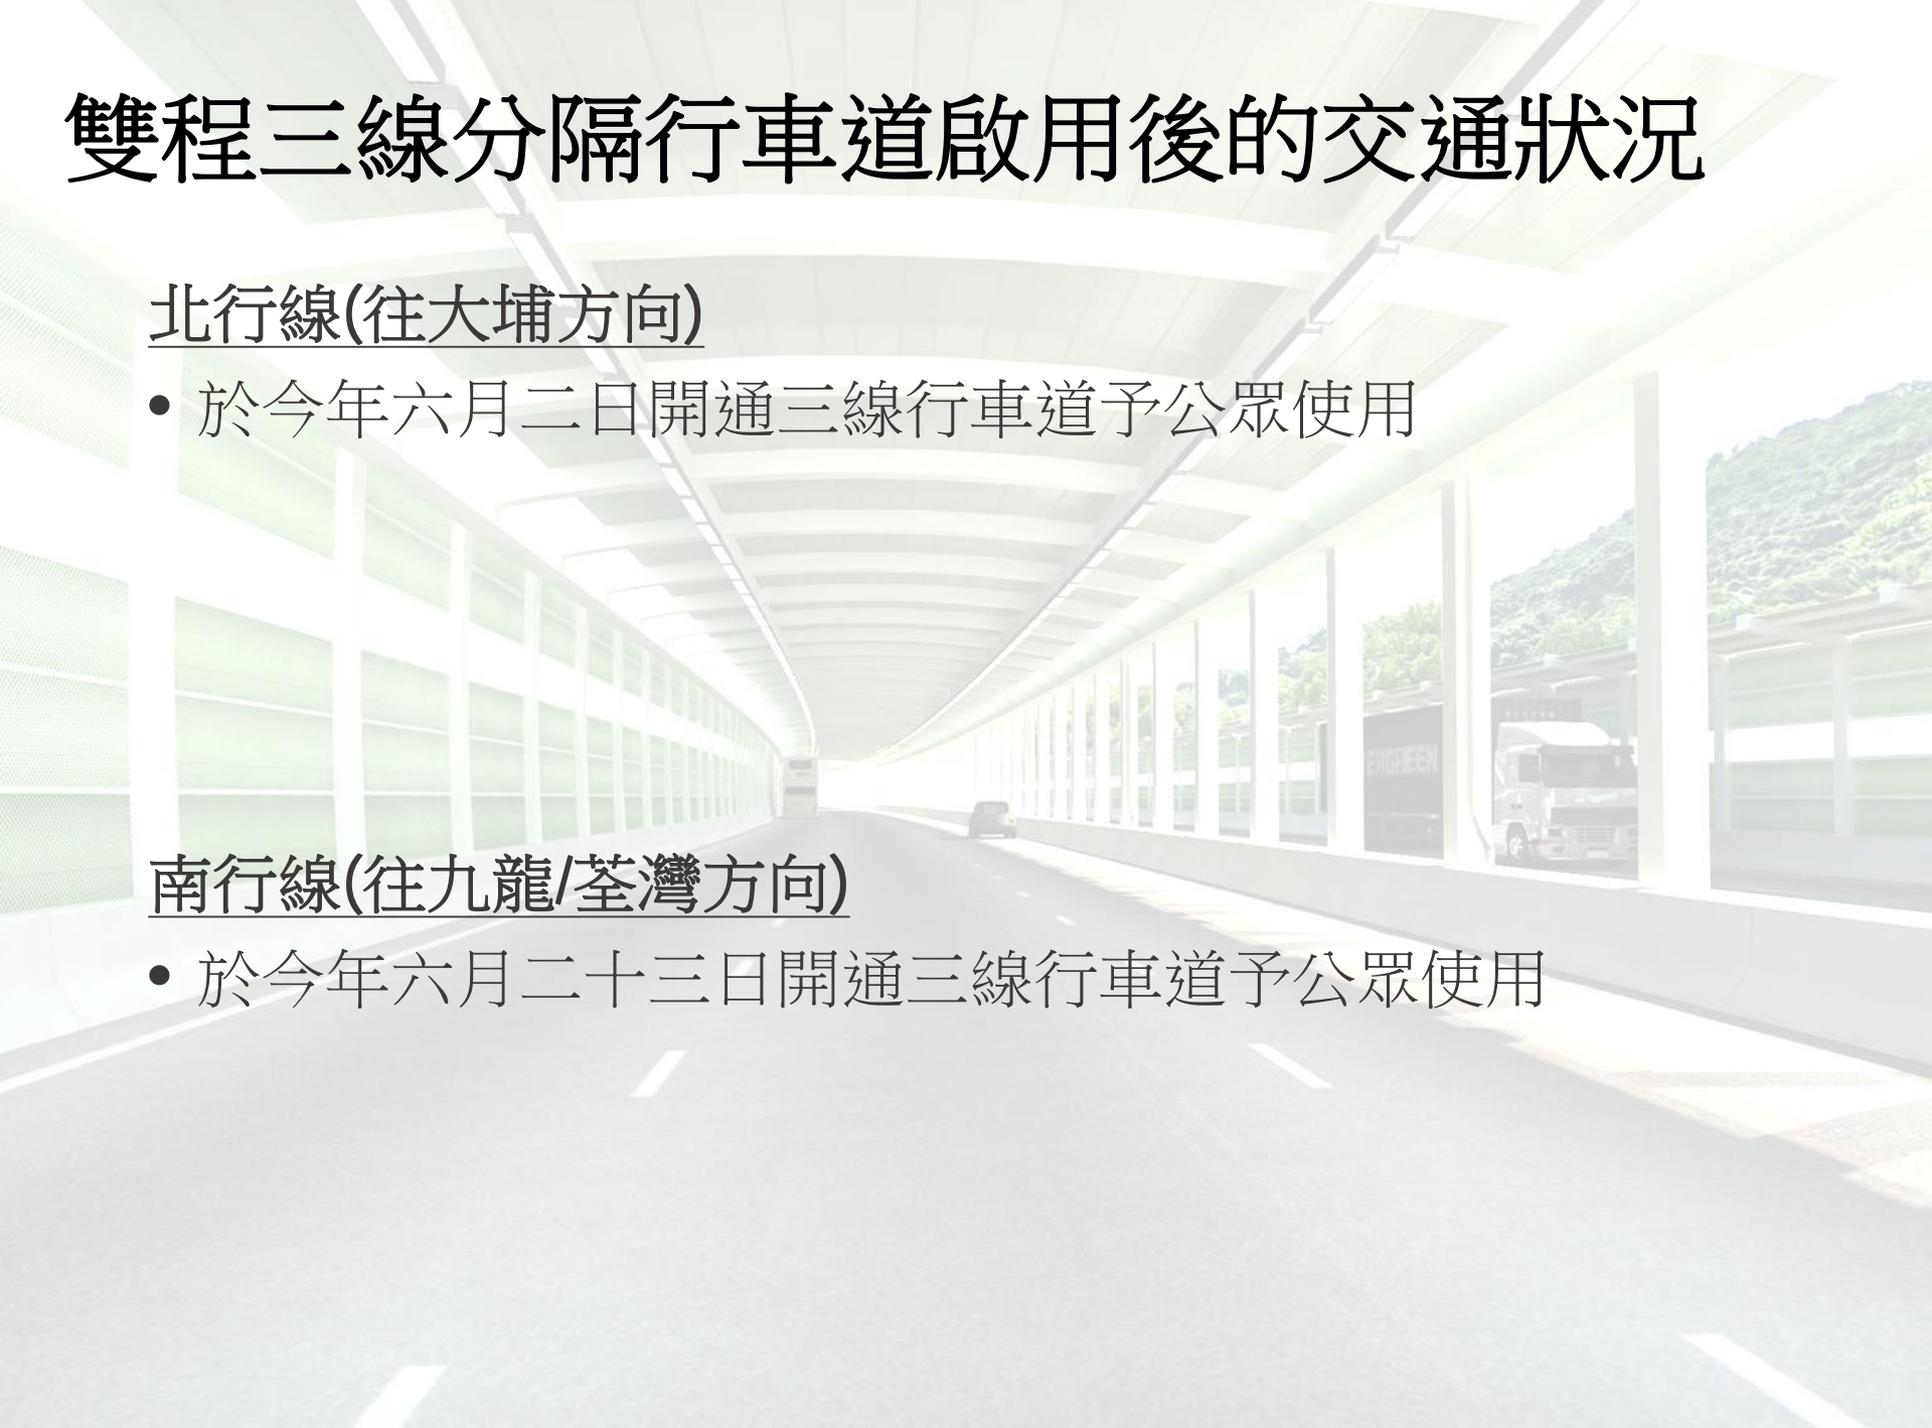

北行線(往大埔方向)

- 於今年六月二日開通三線行車道予公眾使用

南行線(往九龍/荃灣方向)

- 於今年六月二十三日開通三線行車道予公眾使用

雙程三線分隔行車道啟用後的交通狀況

早上繁忙時間交通實況(沙田新城市廣場對出)



(通車前)



二零二四年六月(通車後)

雙程三線分隔行車道啟用後的交通狀況

傍晚繁忙時間交通實況(偉華中心對出)



(通車前)



二零二四年六月(通車後)

餘下工程最新進度

餘下工程最新進度

1. 沙田鄉事會路交匯處的餘下橋面工程，例如路邊石，街道裝置等，預計將於今年第三季完成



路邊石建造

餘下工程最新進度

2. 單車隧道正進行工程，相關單車道預計將於今年第四季完成並重新開放予公眾使用



單車隧道路面重建工程(沙田廣場至連城廣場)

餘下工程最新進度

2. 單車坡道正進行工程，相關單車道預計將於今年第四季完成並重新開放予公眾使用




單車坡道示意圖

單車坡道結構工程
(於沙田鄉事會路旁近瀝源邨)

餘下工程最新進度

3. 餘下的隔音屏障加建工程亦預計於今年第四季完成

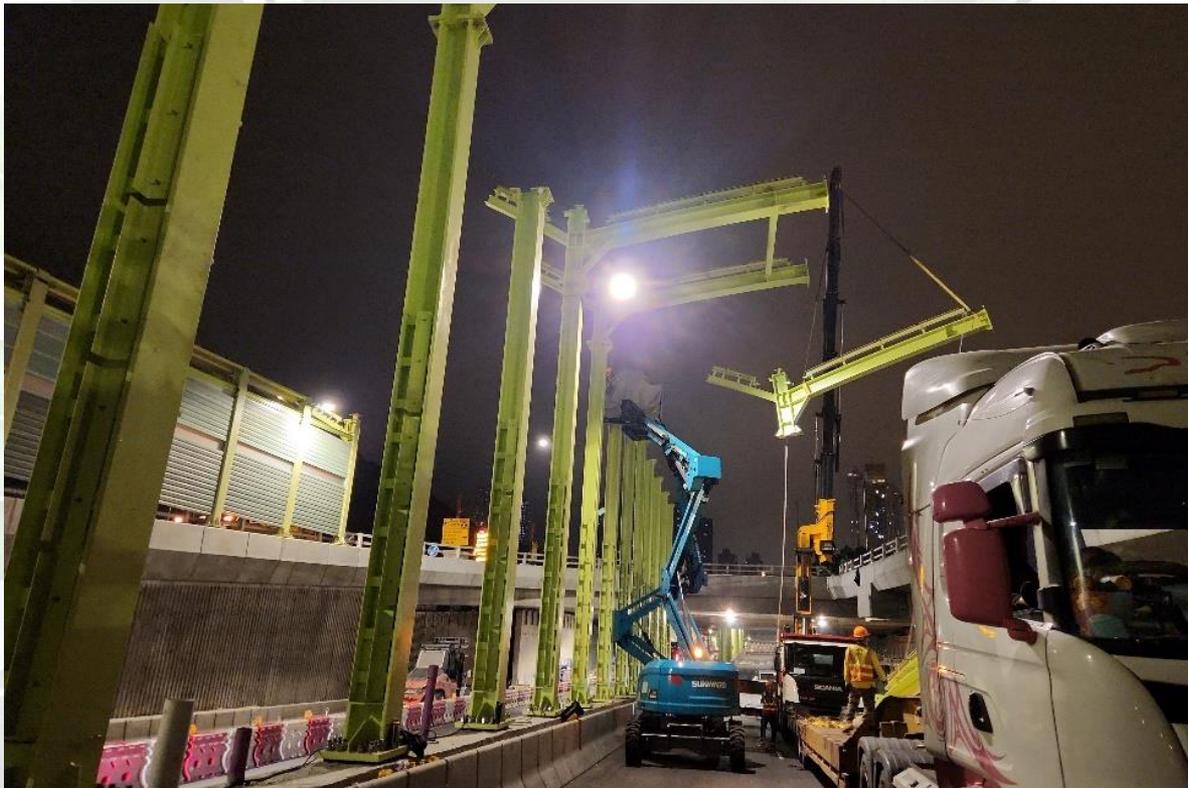

隔音屏障加建工程 (沙田廣場至沙田警署)

還原大埔公路車速限制的安排

完
