黃大仙區議會轄下

交通運輸委員會文件第 25/2024 號(2024 年 6 月 18 日會議)

黄大仙區交通改善工程進度報告

目的

本文件旨在向委員報告截至 2024 年 5 月 27 日黃大仙區交通 改善工程的進度。

背景

2. 運輸署及路政署於過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的 主要交通改善工程項目及時間表已載於附件。

文件提交

3. 本文件將提交黃大仙區議會轄下交通運輸委員會 2024 年 6 月 18 日第三次會議,供委員備悉。


運輸署/路政署 2024年5月


黄大仙區交通改善工程進度報告


截至2024年5月27日


									鲜王2024年3月27日
編號	項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期[實際動工日期]	預期完工日期[實際完工日期]	工程進度	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
1	WR/23/01035	於鳳舞街近龍翔道交界位置擴闊行人 路,以提升道路安全	鳳舞街	24年3月 [24年4月]	24年5月 [24年4月]	100%	工程已完成。	任延楠 女士 (2399 2507)	李學儀 小姐 (2707 7411)
2	WR/23/01623	延長近斧山道迴旋處位置的巴士站以 配合巴士運作	斧山道	24年3月	24年6月 24年9月	30%	正進行有關工程的前期工作。 [路燈遷移工程進行中]	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
3	WR/24/00210	於近新光中心位置加設道路標記(影 線),以方便行人過路及提升道路安全	盈鳳里	24年3月 [24年4月]	24年4月 [24年4月]	100%	工程已完成。	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
4	WR/23/02218	移除部分寧遠街及景福街行人路花槽 ,以方便電單車駕駛人士使用附近行 人路,優化道路安全	寧遠街近景 福街	24年6月	24年8月	30%	正進行有關工程的前期工作。 [申請臨時封電單車位]	郭偉昌 先生 (2399 2767)	李學儀 小姐 (2707 7411)
5	WR/23/02303	在行人過路處加設及更換路旁欄杆種 類,以提升道路安全	彩虹道近彩 虹邨	24年6月	24年9月	20%	正進行有關工程的前期工作。 [申請掘路許可證]	郭偉昌 先生 (2399 2767)	李學儀 小姐 (2707 7411)
6	WR/23/02405	於橫頭磡南道的小巴總站加設道路交 通標誌。在小巴非營運時間可以將小 巴停泊在總站,以改善路旁空間	横頭磡南道	24年6月	24年8月	40%	正進行有關工程的前期工作。 [相關交通標誌訂製中]	郭偉昌 先生 (2399 2767)	李學儀 小姐 (2707 7411)
7	WR/24/00368	於近新光中心位置加設行人過路處, 以方便行人過路及提升道路安全	盈鳳里	24年6月	24年10月	20%	正進行有關工程的前期工作。 [申請掘路許可證]	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)
8	WR/23/02585	將四美街一個晚間貨車泊位的生效時 段擴展至星期日及公眾假期,以改善 路旁空間	四美街	24年6月	24年8月	40%	正進行有關工程的前期工作。 [相關交通標誌訂製中]	郭偉昌 先生 (2399 2767)	李學儀 小姐 (2707 7411)
9	WR/24/00555	擴濶穎竹街及翠竹街交界路口探井工程,以屆時提供足夠的空間於較長車輛通行	穎竹街	24年7月	24年10月	10%	正進行有關工程的前期工作。 [申請掘路許可證]	任延楠 女士 (2399 2507)	吳卓衡 先生 (2707 7341)


備註: 請參閱隨附的圖片以了解上述工程的位置

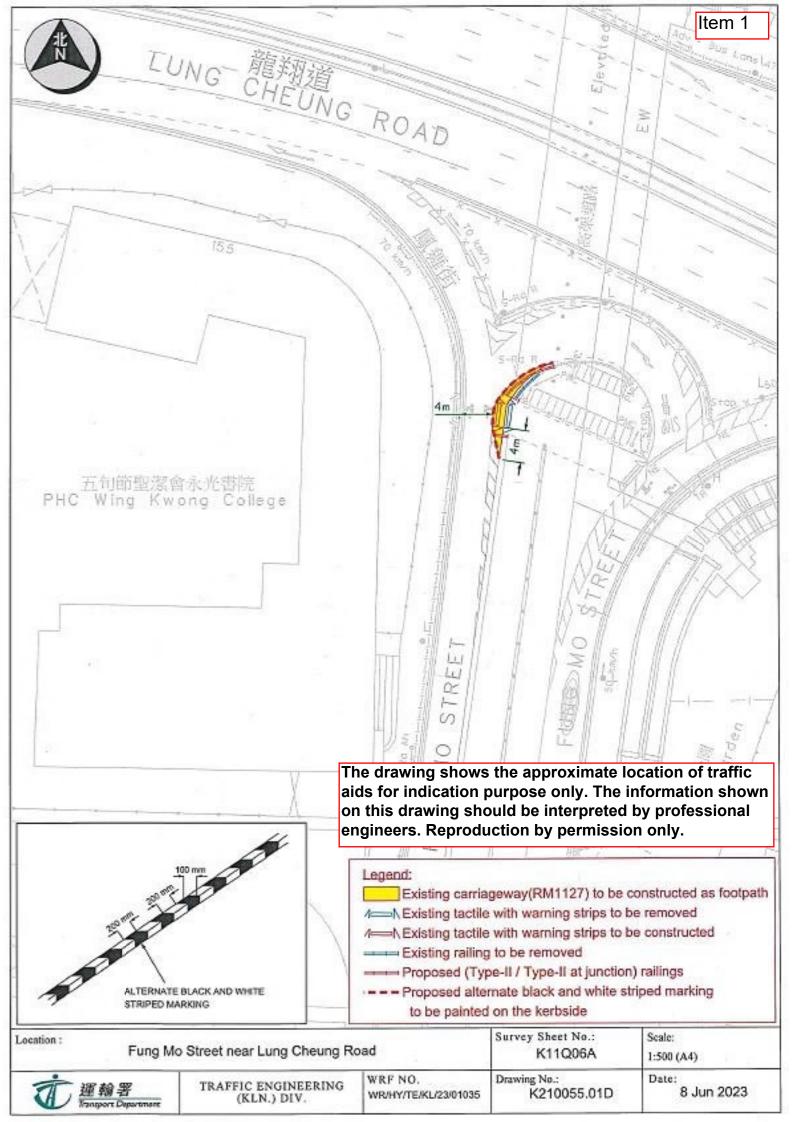

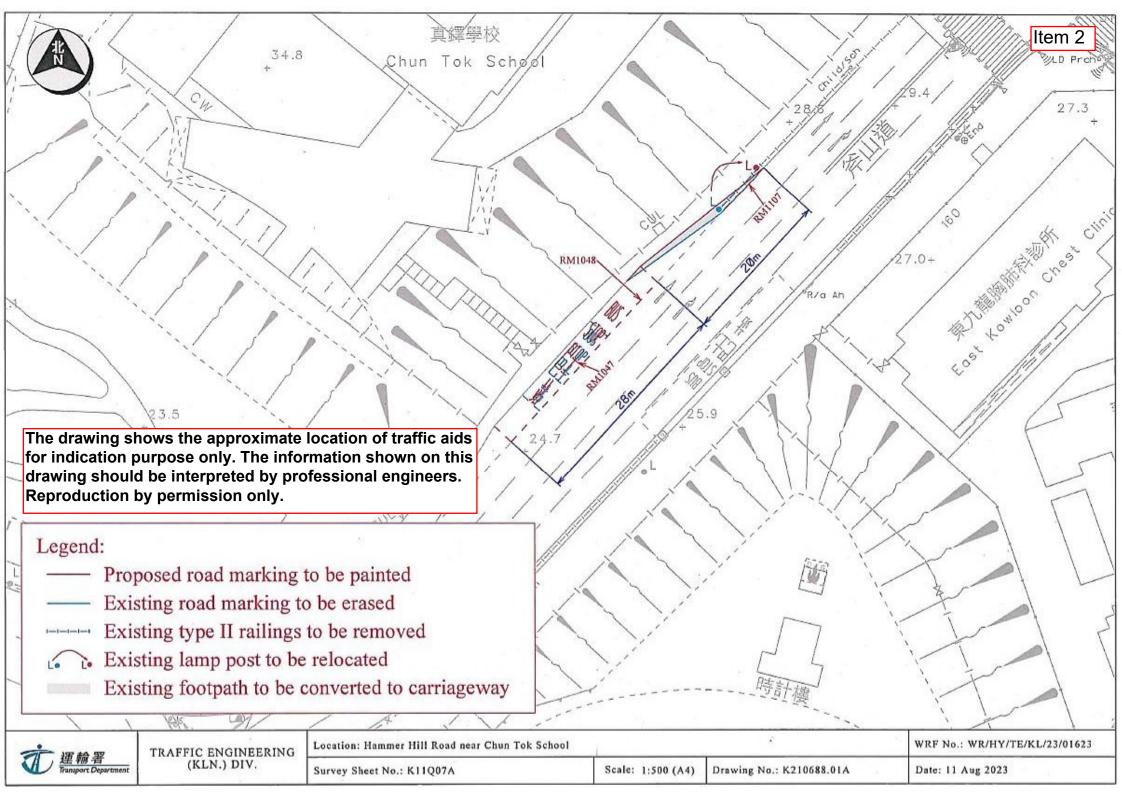

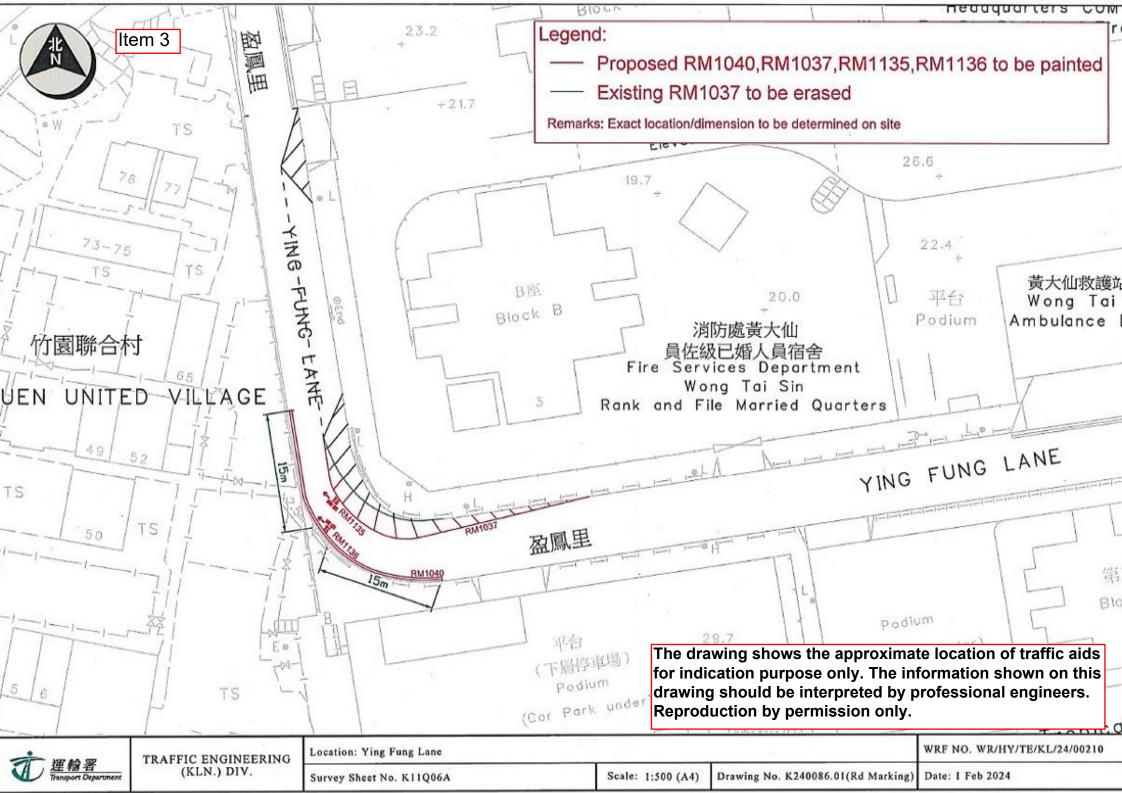

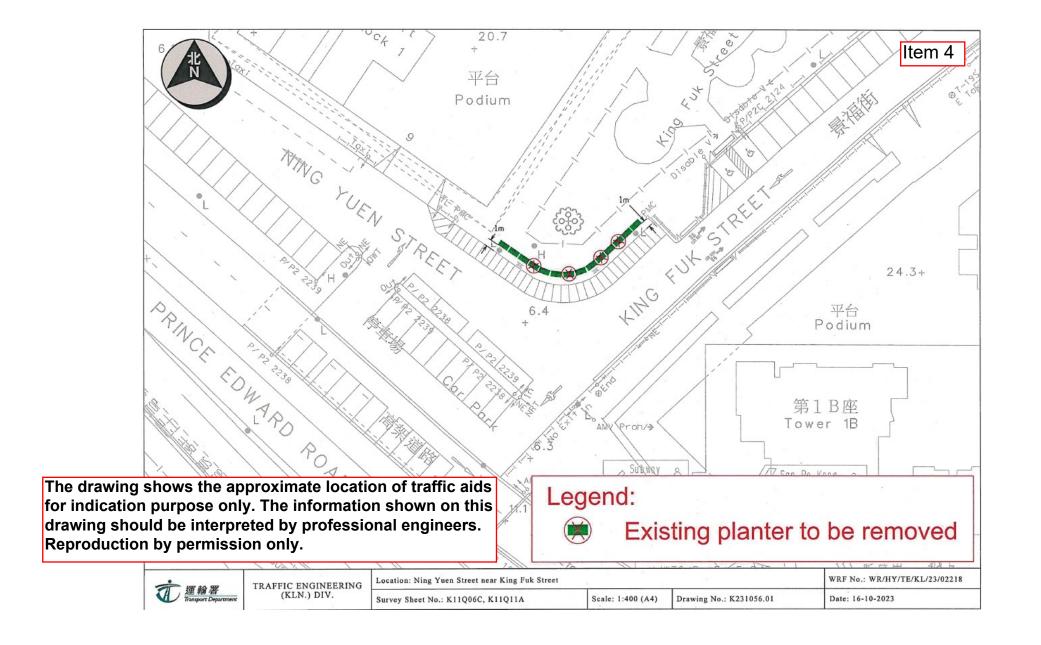

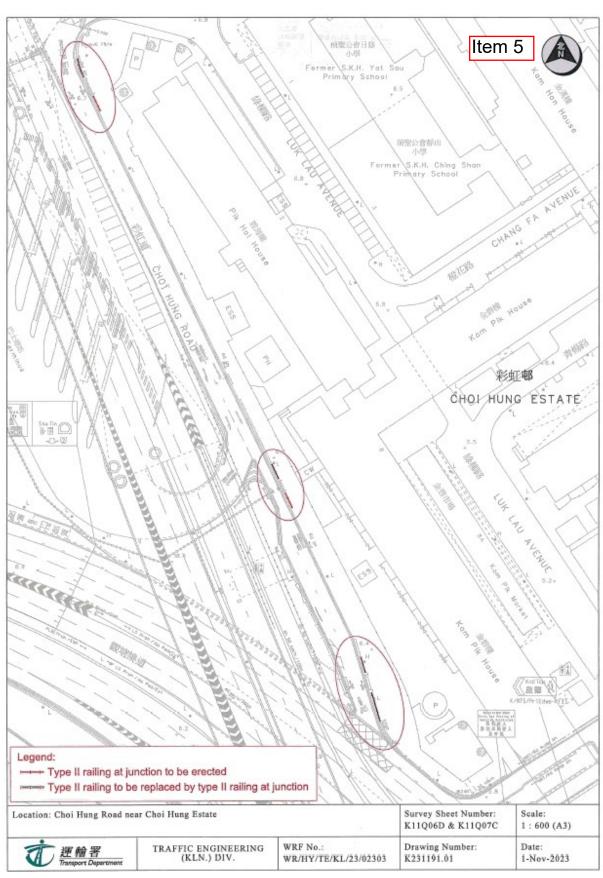

The drawing shows the approximate location of traffic aids for indication purpose only. The information shown on this drawing should be interpreted by professional engineers. Reproduction by permission only.

